Comune di Bassano del Grappa
Provincia di Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA**

Intervento: ASFALTATURA STRADE CITTADINE ANNO 2017


Elaborato: DIAGRAMMA DI GANTT

R.U.P.: ING. ZAMBON ALBERTO

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: GEOM. ANDREA VIERO

scala	SETTEMBRE 2017 data 00 rev.	parere igienico-sanitario	parere autorizzazione monumentale	ESE fase	Si-02 elab. n°

Lavorazione	Durata	Data inizio	Data fine
1 - ACCANTIERAMENTO	1,00	06 11 17 00:00:00	07 11 17 00:00:00
1 . 1 - Segnaletica	1,00	06 11 17 00:00:00	07 11 17 00:00:00
2 - VILLAGGIO EUROPA	15,00	06 11 17 00:00:00	21 11 17 00:00:00
2 . 1 - Fresatura asfalto	5,00	06 11 17 00:00:00	11 11 17 00:00:00
2 . 2 - Messa in quota di chiusini	2,00	11 11 17 00:00:00	13 11 17 00:00:00
2 . 3 - Primer	2,00	13 11 17 00:00:00	15 11 17 00:00:00
2 . 4 - Asfaltatura	5,00	15 11 17 00:00:00	20 11 17 00:00:00
2 . 5 - Tracciamento segnaletica oriz...	1,00	20 11 17 00:00:00	21 11 17 00:00:00
3 - VICOLO CA' REZZONICO	4,00	21 11 17 00:00:00	25 11 17 00:00:00
3 . 1 - Fresatura asfalto	1,00	21 11 17 00:00:00	22 11 17 00:00:00
3 . 2 - Messa in quota di chiusini	0,50	22 11 17 00:00:00	22 11 17 12:00:00
3 . 3 - Primer	0,50	22 11 17 12:00:00	23 11 17 00:00:00
3 . 4 - Asfaltatura	1,00	23 11 17 00:00:00	24 11 17 00:00:00
3 . 5 - Tracciamento segnaletica oriz...	1,00	24 11 17 00:00:00	25 11 17 00:00:00
4 - VIA BONAMIGO	7,00	25 11 17 00:00:00	02 12 17 00:00:00
4 . 1 - Fresatura asfalto	2,00	25 11 17 00:00:00	27 11 17 00:00:00
4 . 2 - Messa in quota di chiusini	1,00	27 11 17 00:00:00	28 11 17 00:00:00
4 . 3 - Primer	1,00	28 11 17 00:00:00	29 11 17 00:00:00
4 . 4 - Asfaltatura	2,00	29 11 17 00:00:00	01 12 17 00:00:00
4 . 5 - Tracciamento segnaletica oriz...	1,00	01 12 17 00:00:00	02 12 17 00:00:00
5 - STRADA CARTIGLIANA	7,00	02 12 17 00:00:00	09 12 17 00:00:00
5 . 1 - Fresatura asfalto	2,00	02 12 17 00:00:00	04 12 17 00:00:00
5 . 2 - Messa in quota di chiusini	1,00	04 12 17 00:00:00	05 12 17 00:00:00
5 . 3 - Primer	1,00	05 12 17 00:00:00	06 12 17 00:00:00
5 . 4 - Asfaltatura	2,00	06 12 17 00:00:00	08 12 17 00:00:00
5 . 5 - Tracciamento segnaletica oriz...	1,00	08 12 17 00:00:00	09 12 17 00:00:00
6 - VIA CAPITELVECCHIO	3,00	09 12 17 00:00:00	12 12 17 00:00:00
6 . 1 - Fresatura asfalto	1,00	09 12 17 00:00:00	10 12 17 00:00:00
6 . 2 - Messa in quota di chiusini	0,50	10 12 17 00:00:00	10 12 17 12:00:00
6 . 3 - Primer	0,50	10 12 17 12:00:00	11 12 17 00:00:00
6 . 4 - Asfaltatura	0,50	11 12 17 00:00:00	11 12 17 12:00:00
6 . 5 - Tracciamento segnaletica oriz...	0,50	11 12 17 12:00:00	12 12 17 00:00:00
7 - VIA COLBACCHINI	10,00	12 12 17 00:00:00	22 12 17 00:00:00
7 . 1 - Fresatura asfalto	3,00	12 12 17 00:00:00	15 12 17 00:00:00
7 . 2 - Messa in quota di chiusini	2,00	15 12 17 00:00:00	17 12 17 00:00:00
7 . 3 - Primer	1,00	17 12 17 00:00:00	18 12 17 00:00:00
7 . 4 - Asfaltatura	3,00	18 12 17 00:00:00	21 12 17 00:00:00
7 . 5 - Tracciamento segnaletica oriz...	1,00	21 12 17 00:00:00	22 12 17 00:00:00

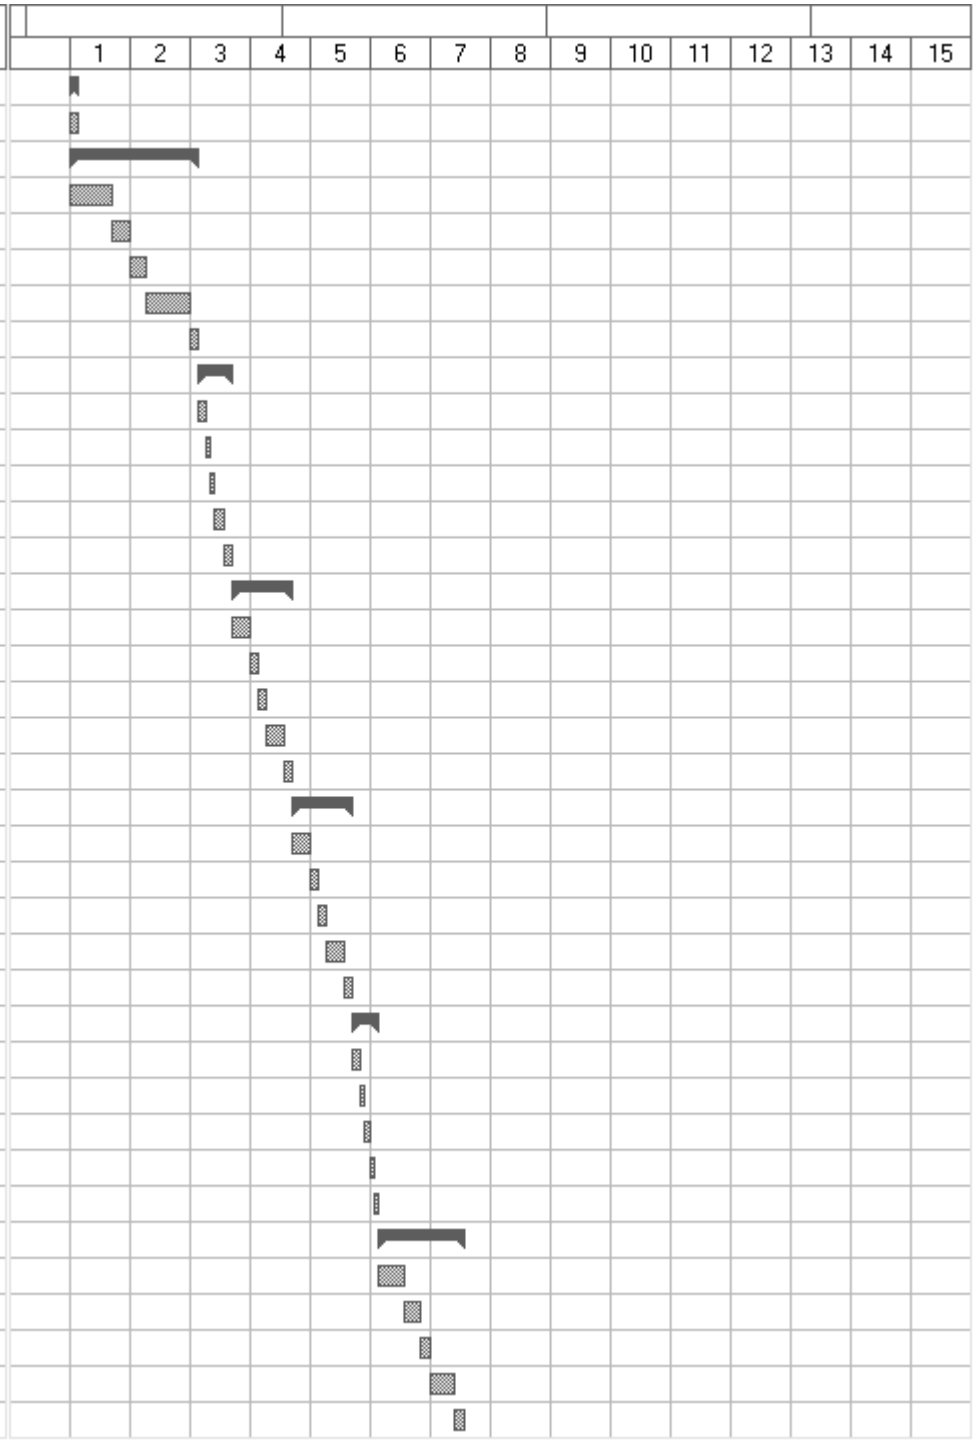

Lavorazione	Durata	Data inizio	Data fine
8 - VIA CRISTOFORO COLOMBO	5,00	22 12 17 00:00:00	27 12 17 00:00:00
8 . 1 - Fresatura asfalto	1,00	22 12 17 00:00:00	23 12 17 00:00:00
8 . 2 - Messa in quota di chiusini	1,00	23 12 17 00:00:00	24 12 17 00:00:00
8 . 3 - Primer	1,00	24 12 17 00:00:00	25 12 17 00:00:00
8 . 4 - Asfaltatura	1,00	25 12 17 00:00:00	26 12 17 00:00:00
8 . 5 - Tracciamento segnaletica oriz...	1,00	26 12 17 00:00:00	27 12 17 00:00:00
9 - MARCIAPIEDE VIA SAN ROCCO	7,00	27 12 17 00:00:00	03 01 18 00:00:00
9 . 1 - Fresatura asfalto	2,00	27 12 17 00:00:00	29 12 17 00:00:00
9 . 2 - Messa in quota di chiusini	1,00	29 12 17 00:00:00	30 12 17 00:00:00
9 . 3 - Primer	1,00	30 12 17 00:00:00	31 12 17 00:00:00
9 . 4 - Asfaltatura	2,00	31 12 17 00:00:00	02 01 18 00:00:00
9 . 5 - Tracciamento segnaletica oriz...	1,00	02 01 18 00:00:00	03 01 18 00:00:00
10 - RAPEZZI	2,00	03 01 18 00:00:00	05 01 18 00:00:00
10 . 1 - Fresatura asfalto	0,50	03 01 18 00:00:00	03 01 18 12:00:00
10 . 2 - Messa in quota di chiusini	0,50	03 01 18 12:00:00	04 01 18 00:00:00
10 . 3 - Primer	0,50	04 01 18 00:00:00	04 01 18 12:00:00
10 . 4 - Asfaltatura	0,50	04 01 18 12:00:00	05 01 18 00:00:00
11 - SGOMBERO CANTIERE	1,00	05 01 18 00:00:00	06 01 18 00:00:00
2 . 1 - Rimozione segnaletica	1,00	05 01 18 00:00:00	06 01 18 00:00:00

