Comune di Bassano del Grappa
Provincia di Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA**

Intervento: ASFALTATURA STRADE CITTADINE ANNO 2017

Elaborato: SCHEDE SPECIFICHE GESTIONE CANTIERE


R.U.P.: ING. ZAMBON ALBERTO

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: GEOM. ANDREA VIERO

scala	SETTEMBRE 2017 data 00 rev.	parere igienico-sanitario	parere autorizzazione monumentale	ESE fase	Si-03 elab. n°

TRATTO 01 - Villaggio Europa


ISTRUZIONI OPERATIVE:
Obbligo di instituire senso unico altrernato con ausilio di movieri stabili e/o impianto semaforico mobile

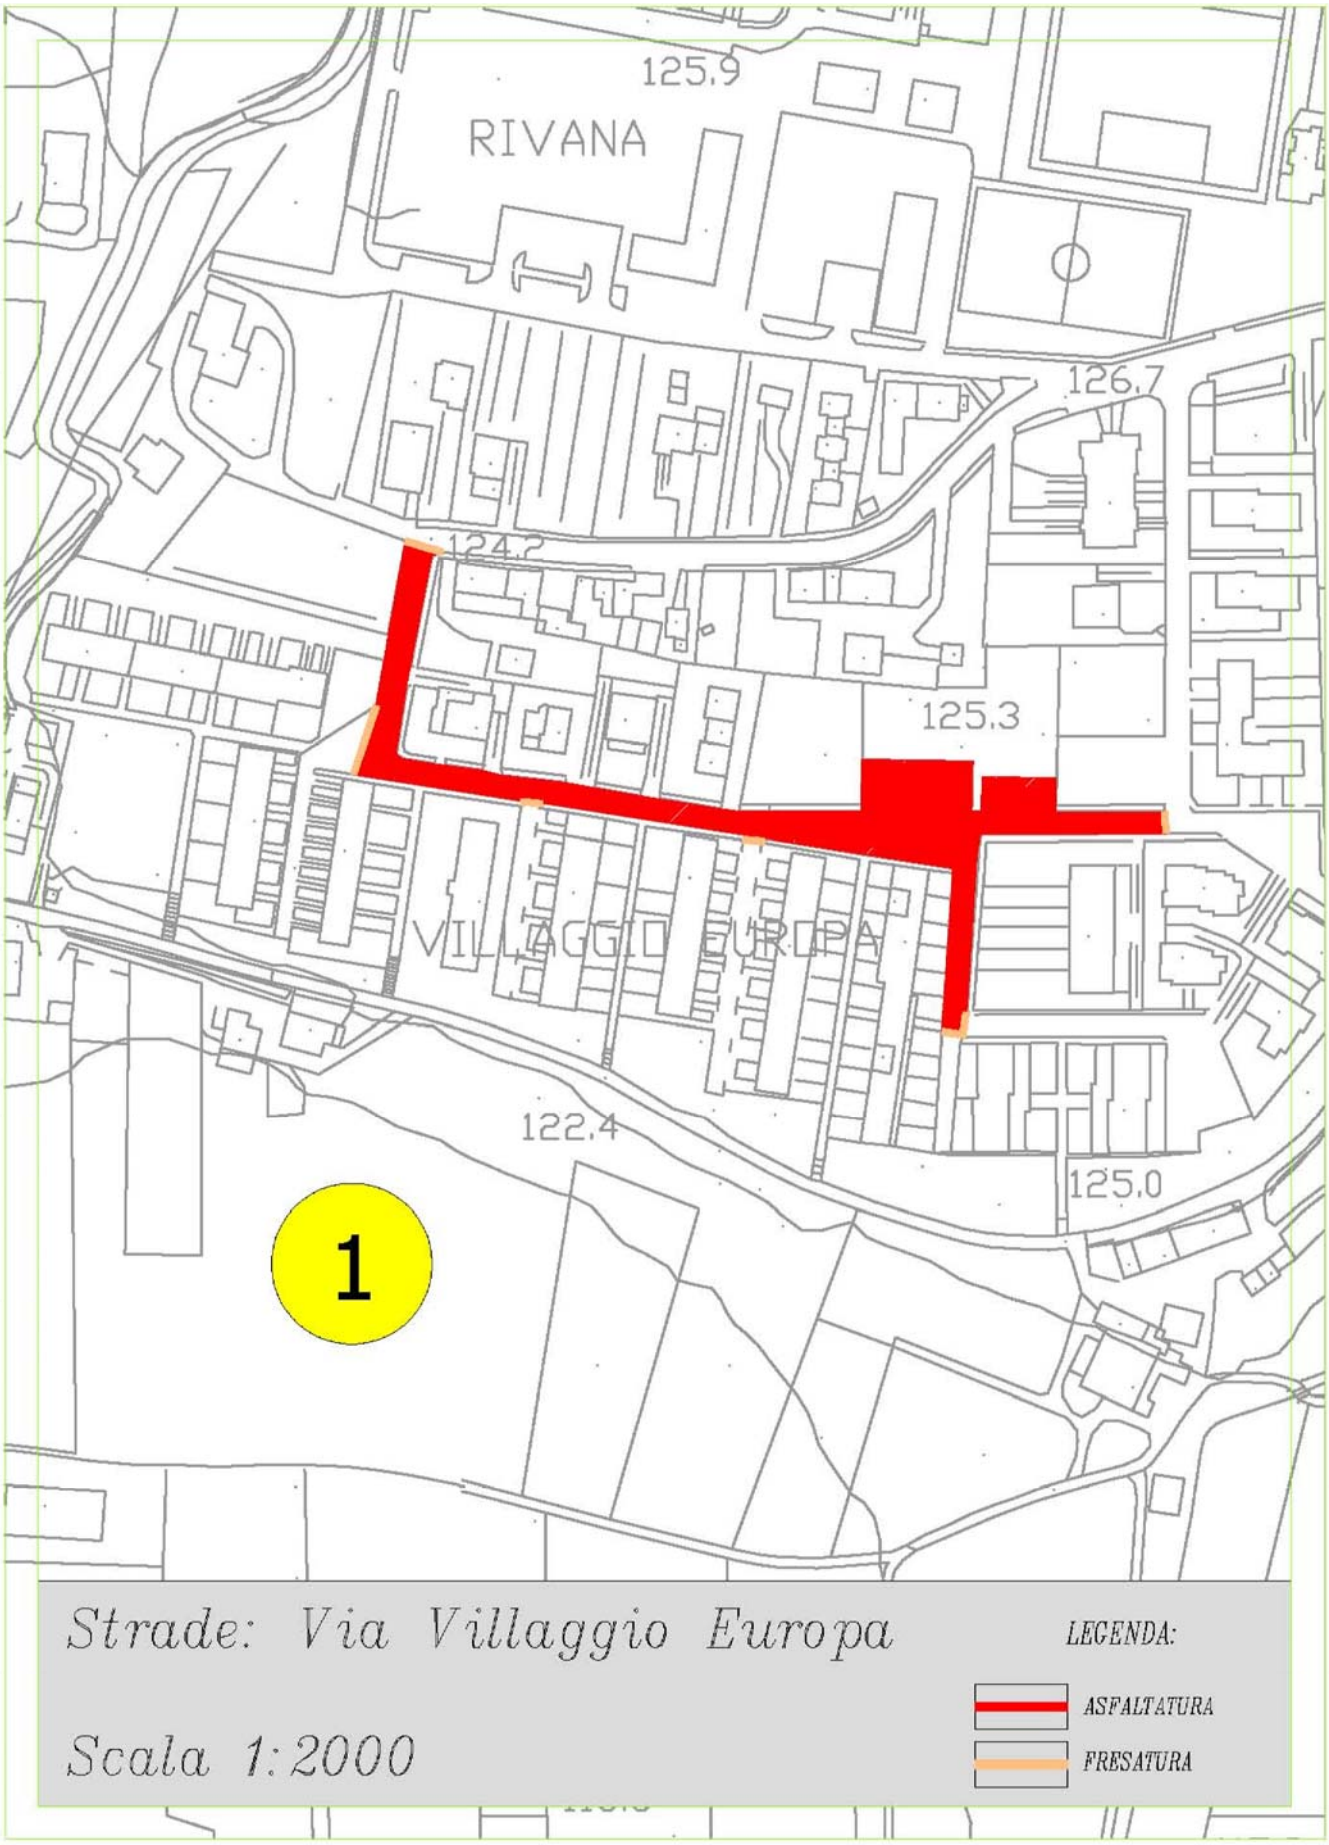

TRATTO 02 - Vicolo Ca' Rezzonico

ISTRUZIONI OPERATIVE:


Chiusura della strada con accesso controllato dei frontisti da parte di personale moviere - deviazione dei mezzi provenienti da Vicolo Ca' Rezzonico verso Via Belvedere. Nell'incrocio tra Via Cereria e Via Belvedere segnalare che la strada è chiusa

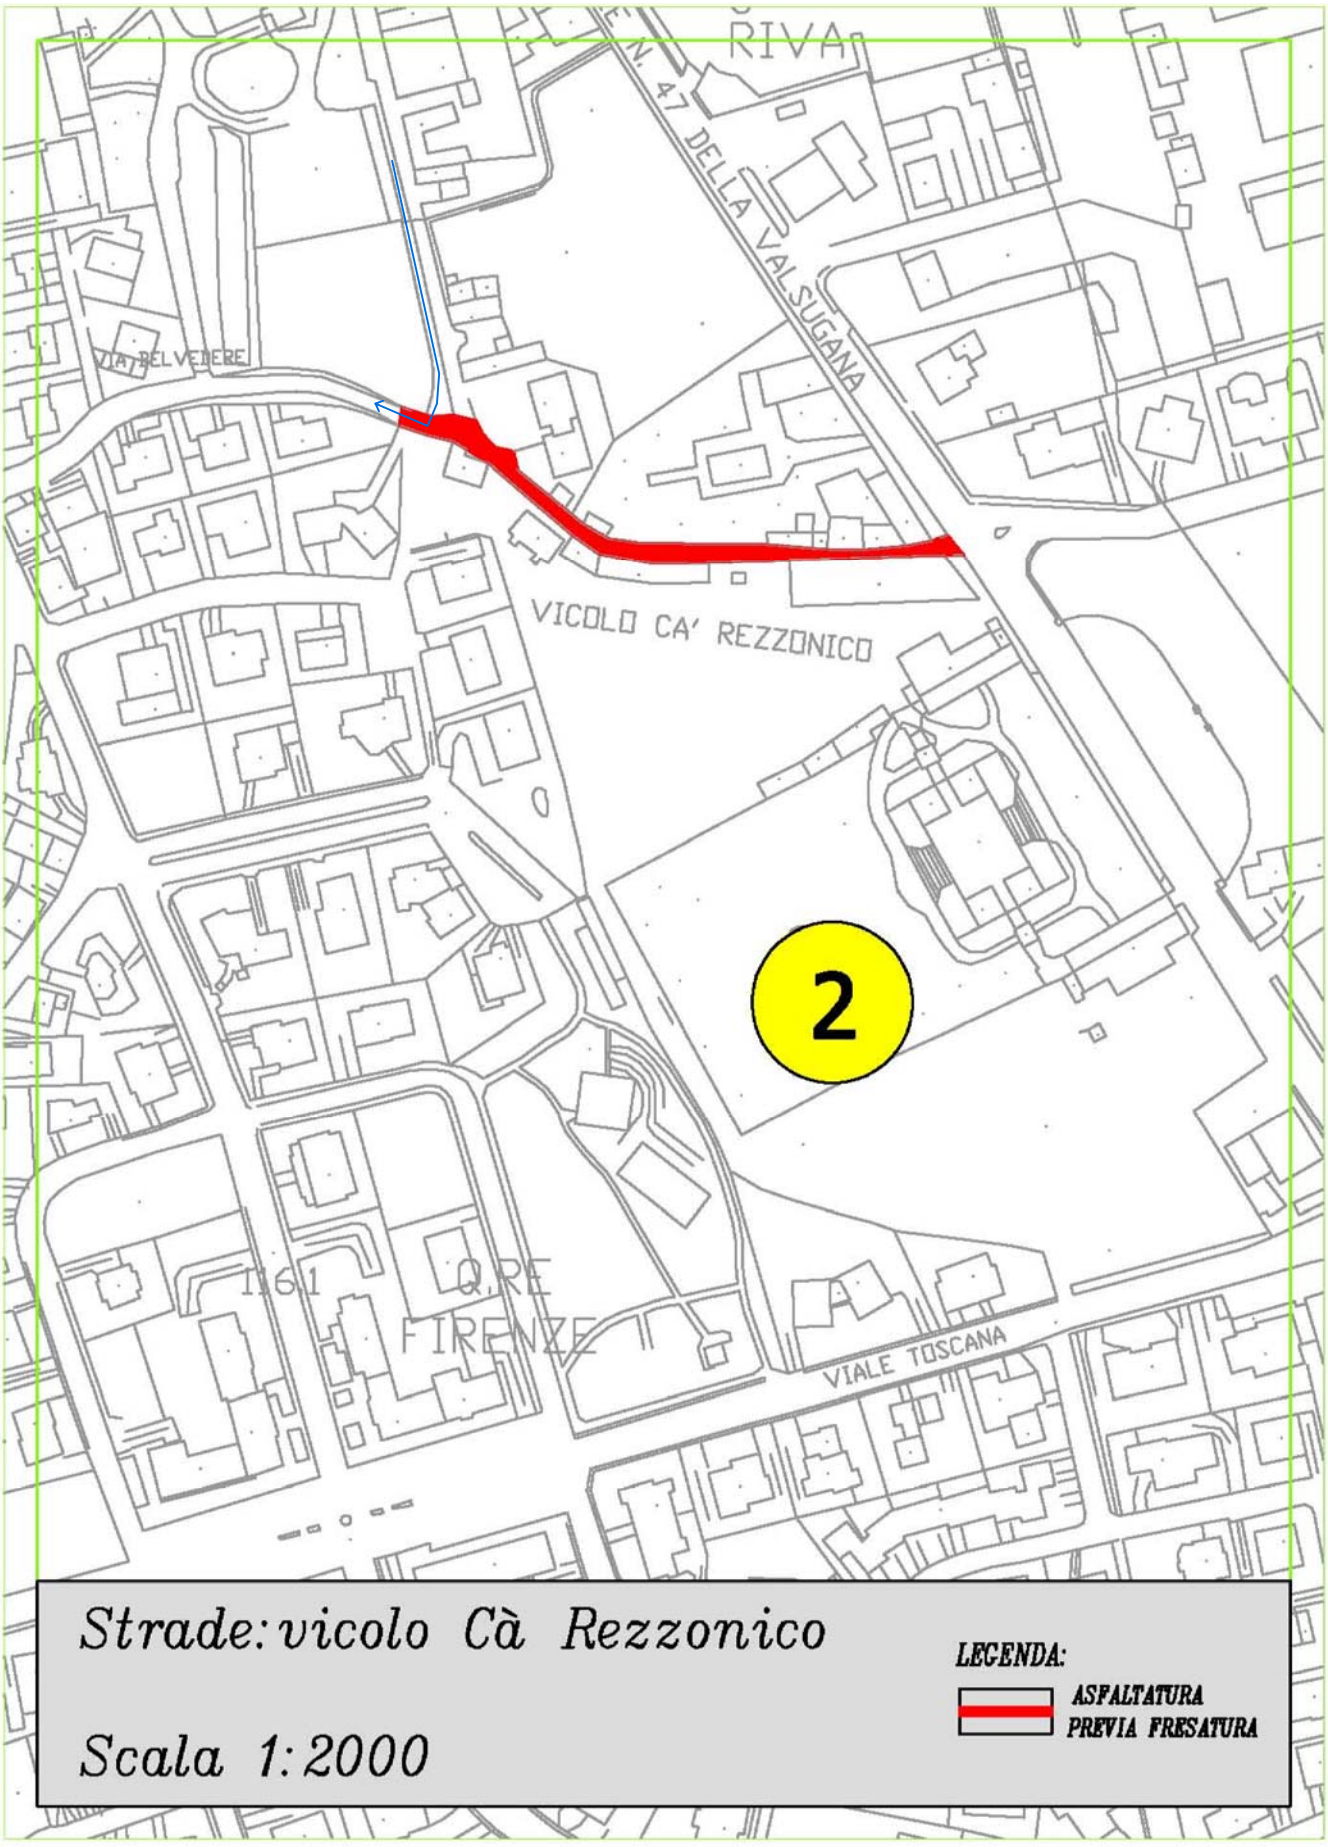

TRATTO 03 - Via Bonamigo

ISTRUZIONI OPERATIVE:


Chiusura totale dell'area che dovrà essere fisicamente delimitata da idonea recinzione - i mezzi provenienti da Via Matteotti dovranno deviare per via Gamba. I mezzi in uscita dal Terraglio dovranno scendere verso viale dei Martiri. Per i pedoni dovrà essere predisposto passaggio protetto prima lungo il lato est della "piazzetta" e poi lungo il lato ovest a seconda dell'andamento dei lavori

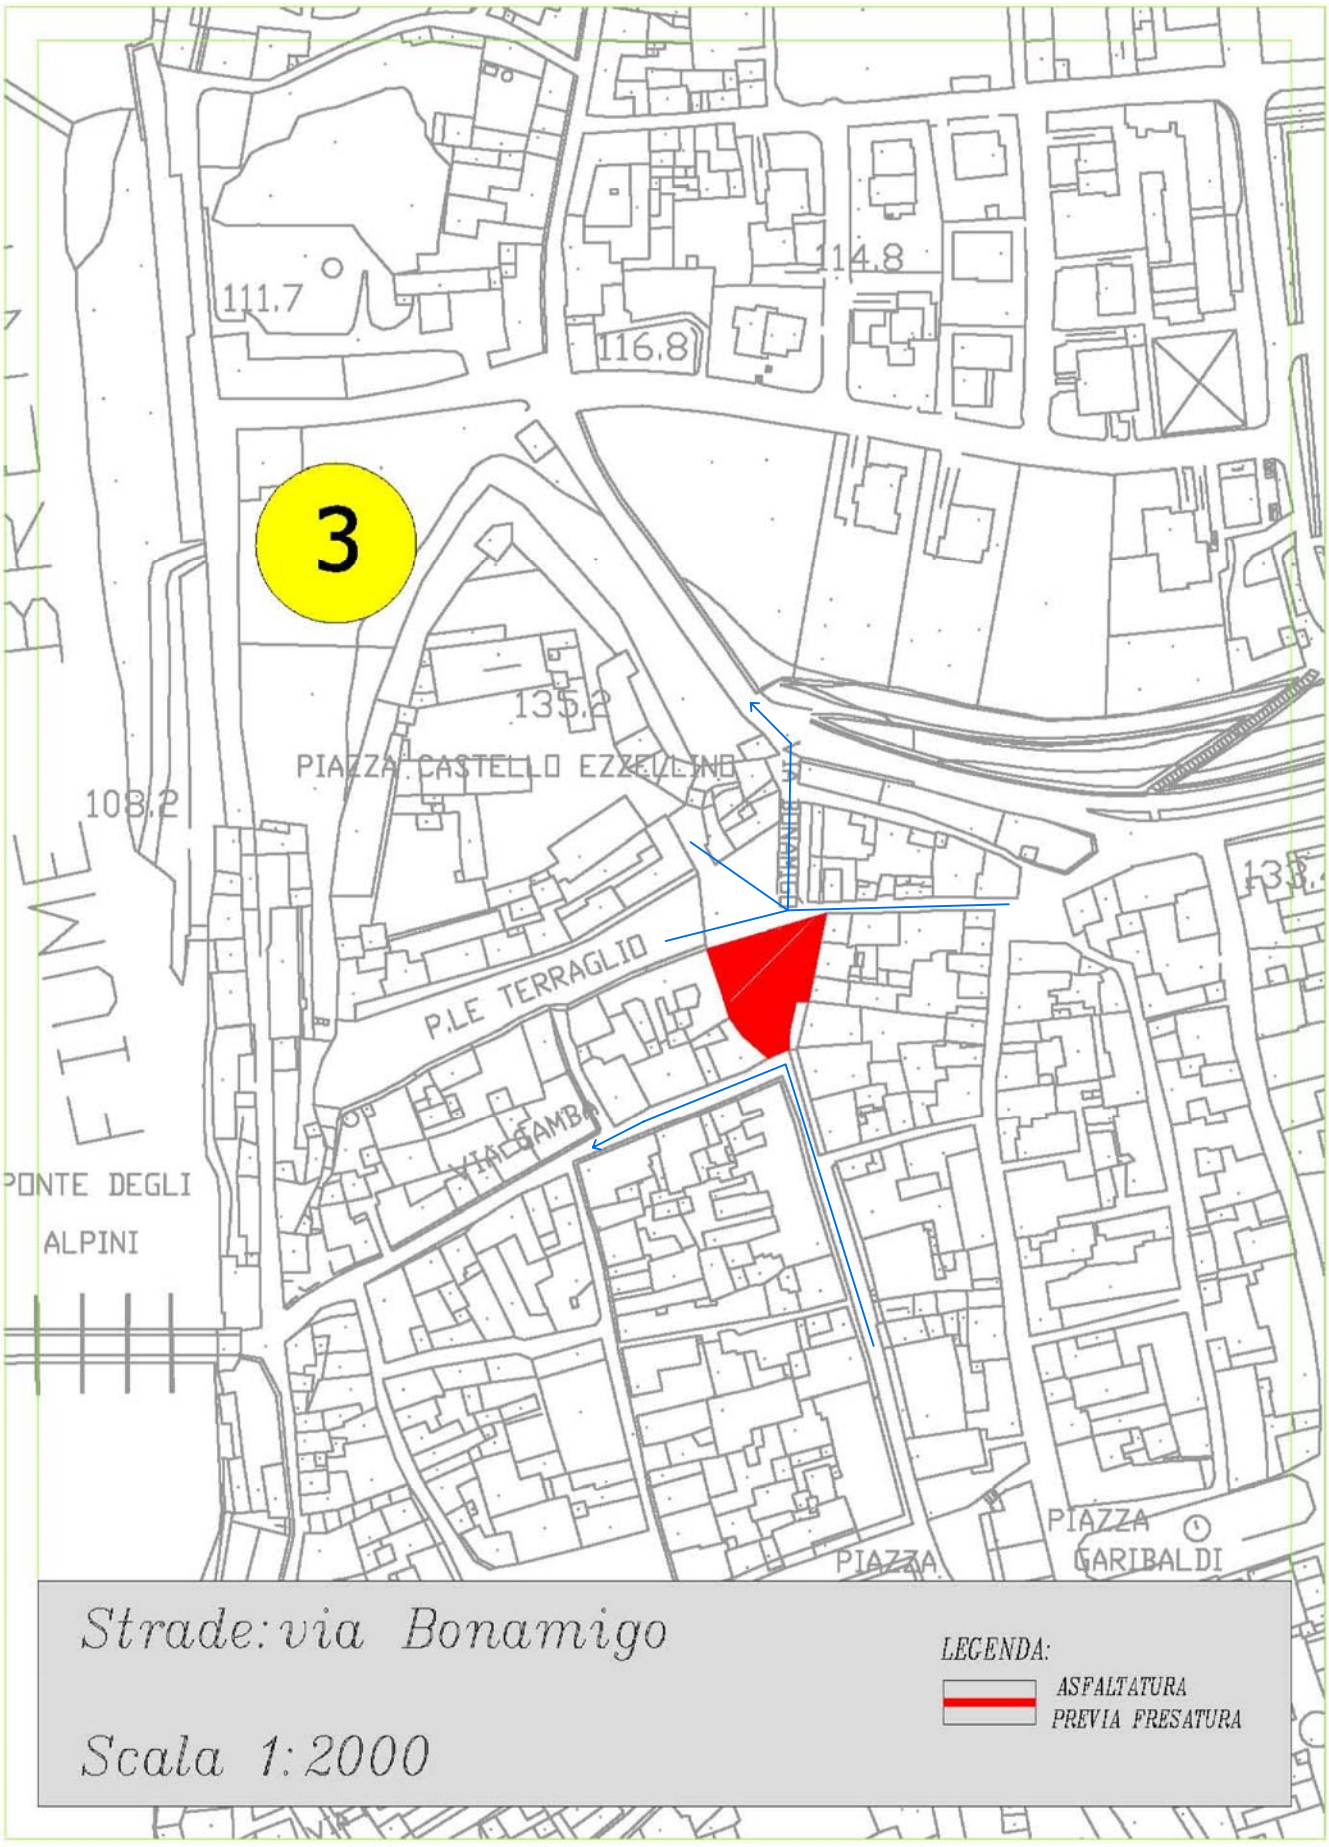

TRATTO 03 - Via Bonamigo

ISTRUZIONI OPERATIVE:

Chiusura totale dell'area che dovrà essere fisicamente delimitata da idonea recinzione - i mezzi provenienti da Via Matteotti dovranno deviare per via Gamba. I mezzi in uscita dal Terraglio dovranno scendere verso viale dei Martiri. Per i pedoni dovrà essere predisposto passaggio protetto prima lungo il lato est della "piazzetta" e poi lungo il lato ovest a seconda dell'andamento dei lavori

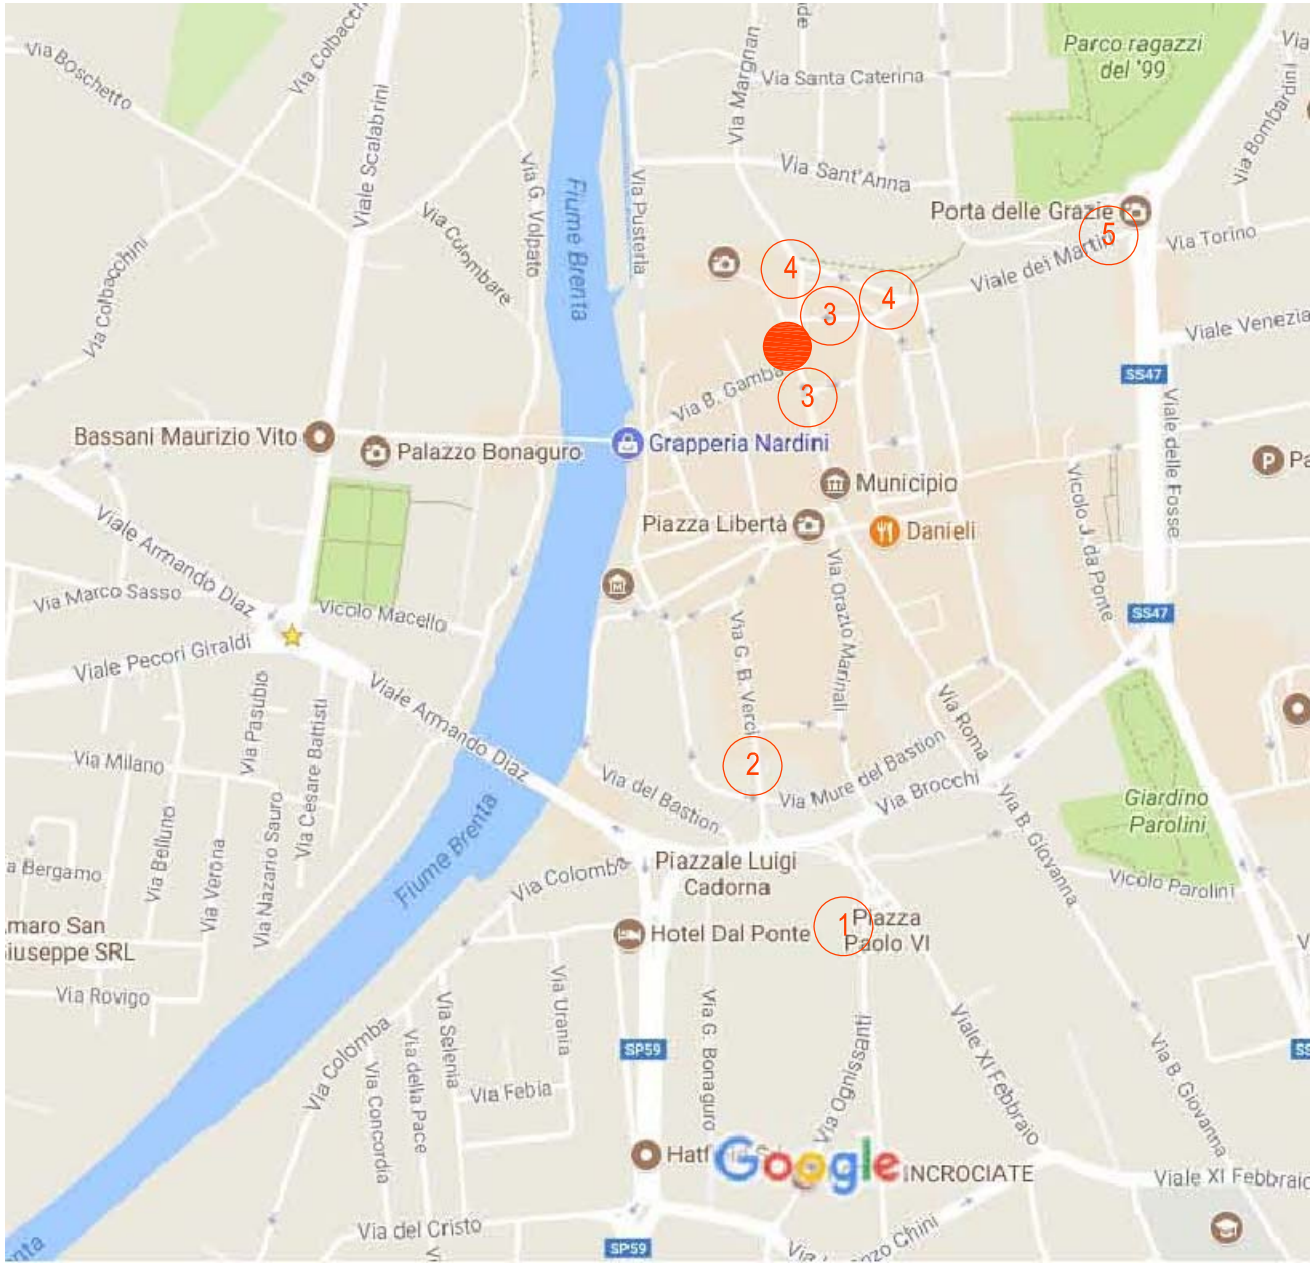

1 *Chiusura accesso a Piazza Terraglio da Via Matteotti dal... al....*
Deviazione verso Viale XI Febbraio

2 *Chiusura accesso a Piazza Terraglio da Via Matteotti dal... al....*
Deviazione su Via Mure del Bastion


3 *Via Bonamigo chiusa dal..... al .....*

4 *Chiusura Via Bonamigo*
Deviazione su Viale dei Martiri per raggiugere Piazza Terraglio

5 *Chiusura Via Bonamigo*
Deviazione su Viale delle Fosse per raggiungere Piazza Terraglio


TRATTO 04 - Strada Cartigliana

ISTRUZIONI OPERATIVE:
Obbligo di instituire senso unico altrernato con ausilio di movieri stabili e/o impianto semaforico mobile

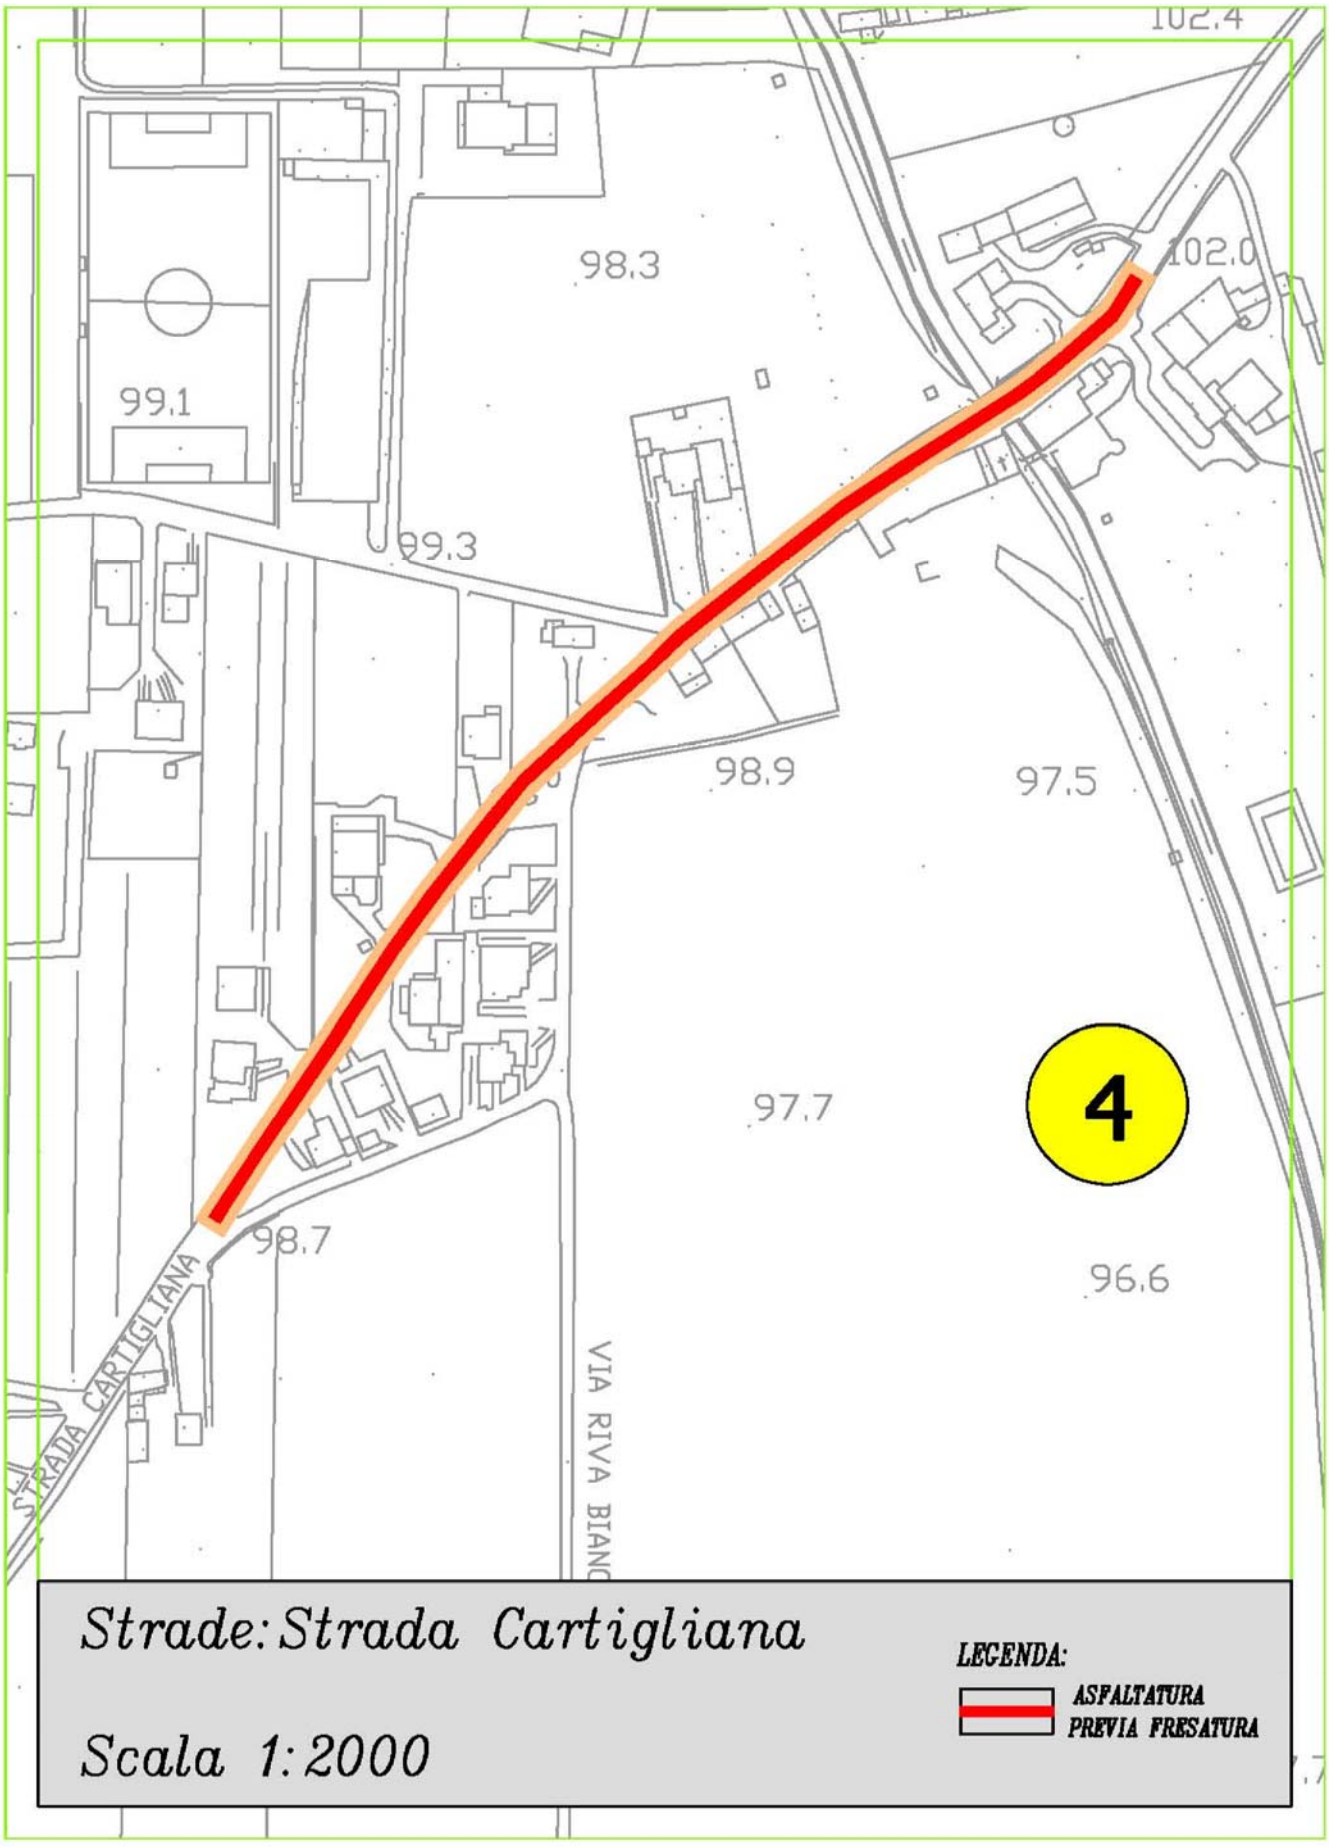


TRATTO 05 - Via Capitelvecchio

ISTRUZIONI OPERATIVE:
Obbligo di restringimento della carreggiata, lasciando sempre lo spazio necessario al transito veicolare con adeguata segnaletica e con sorveglianza da parte dei movieri

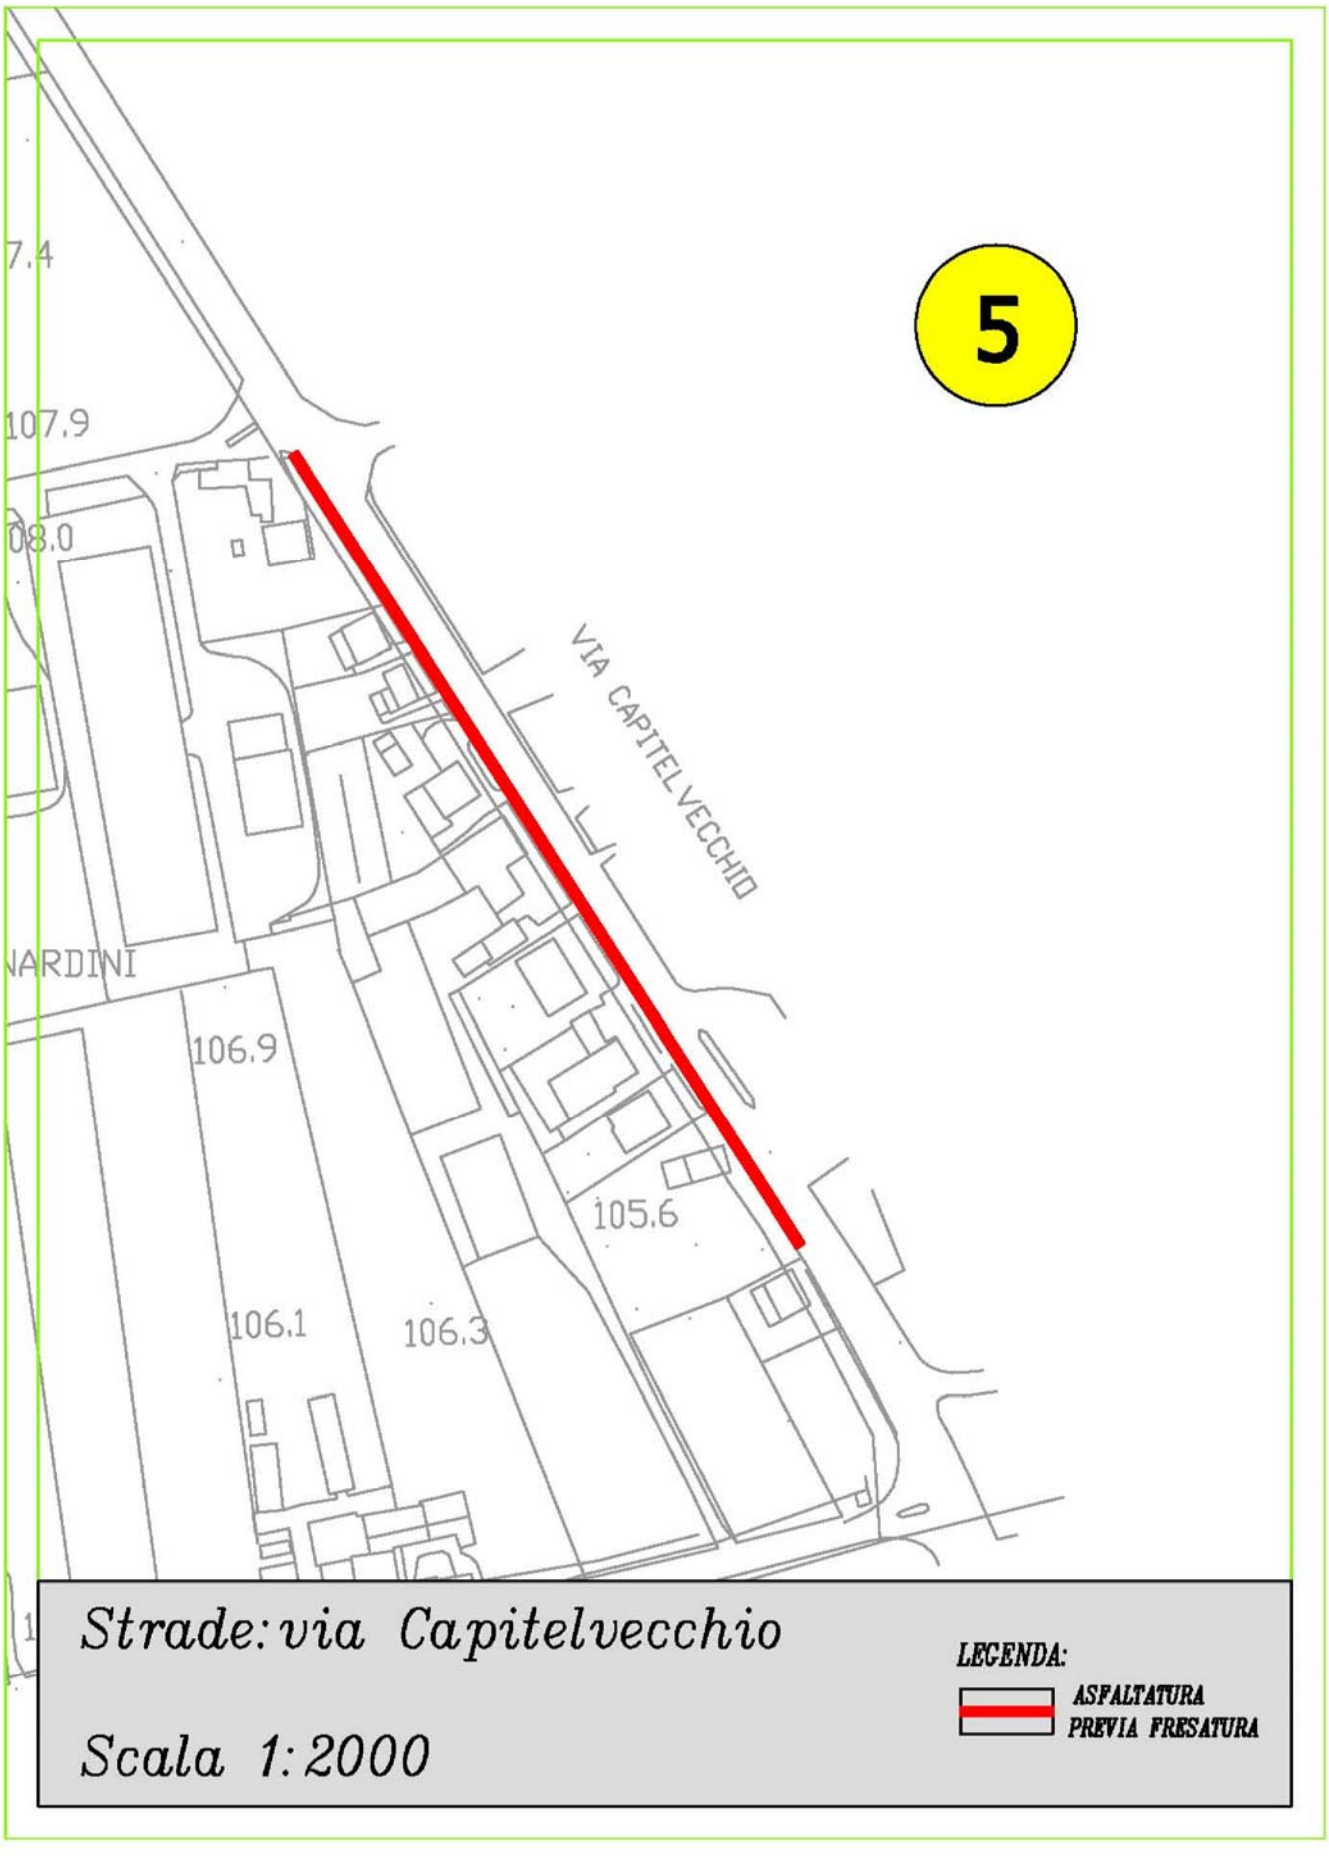

TRATTO 06 - Via Colbacchini


ISTRUZIONI OPERATIVE:
Chiusura totale della strada con addetti movieri che regolano l'accesso da parte dei frontisti. All'ingresso di Via Colombare segnalare la chiusura totale del tratto interessato dai lavori

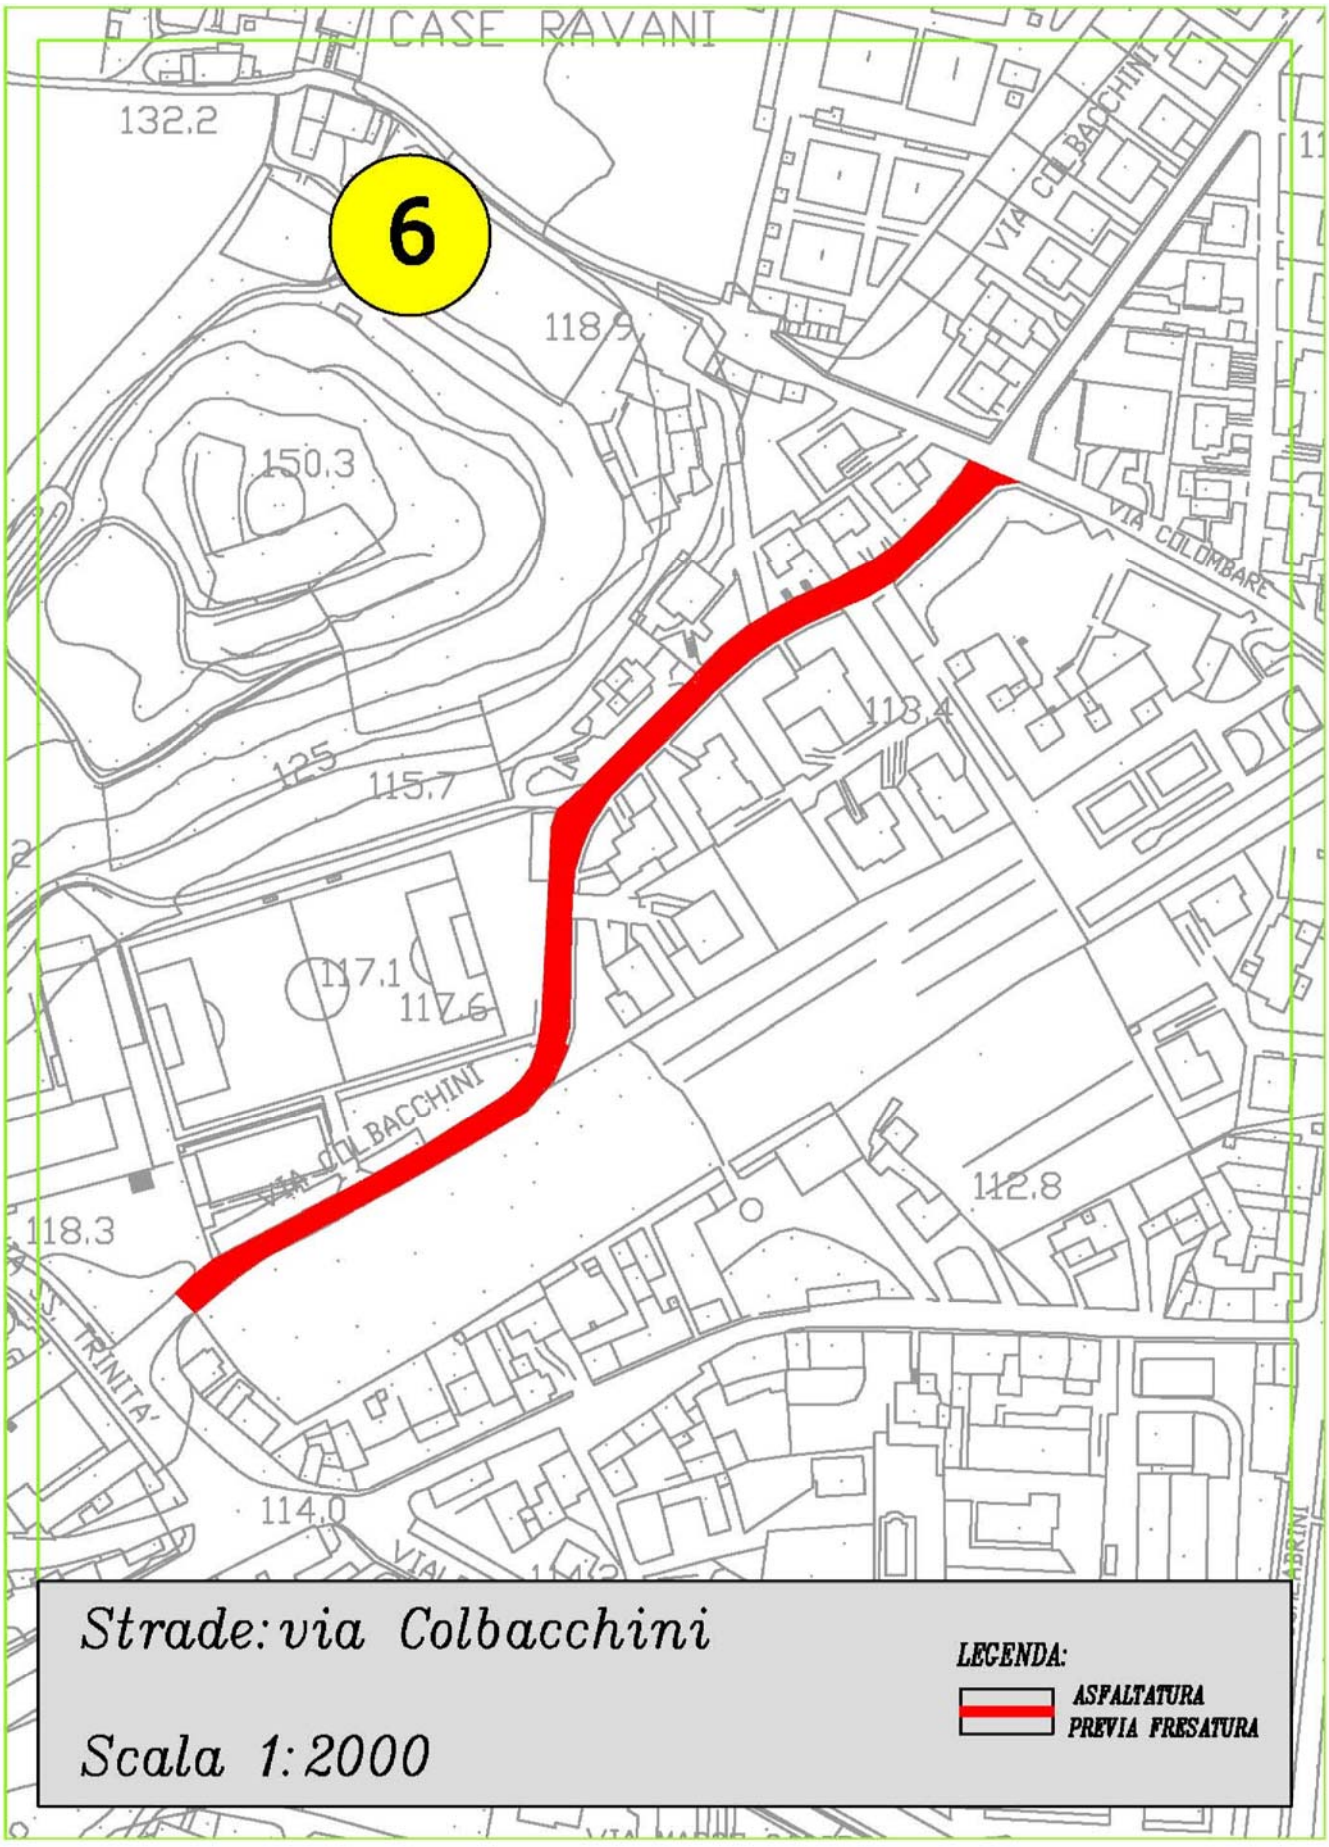

TRATTO 07 - Via Cristoforo Colombo (tratto)

ISTRUZIONI OPERATIVE:

Obbligo di restringimento della carreggiata, lasciando sempre lo spazio necessario al transito veicolare con adeguata segnaletica e con sorveglianza da parte dei movieri

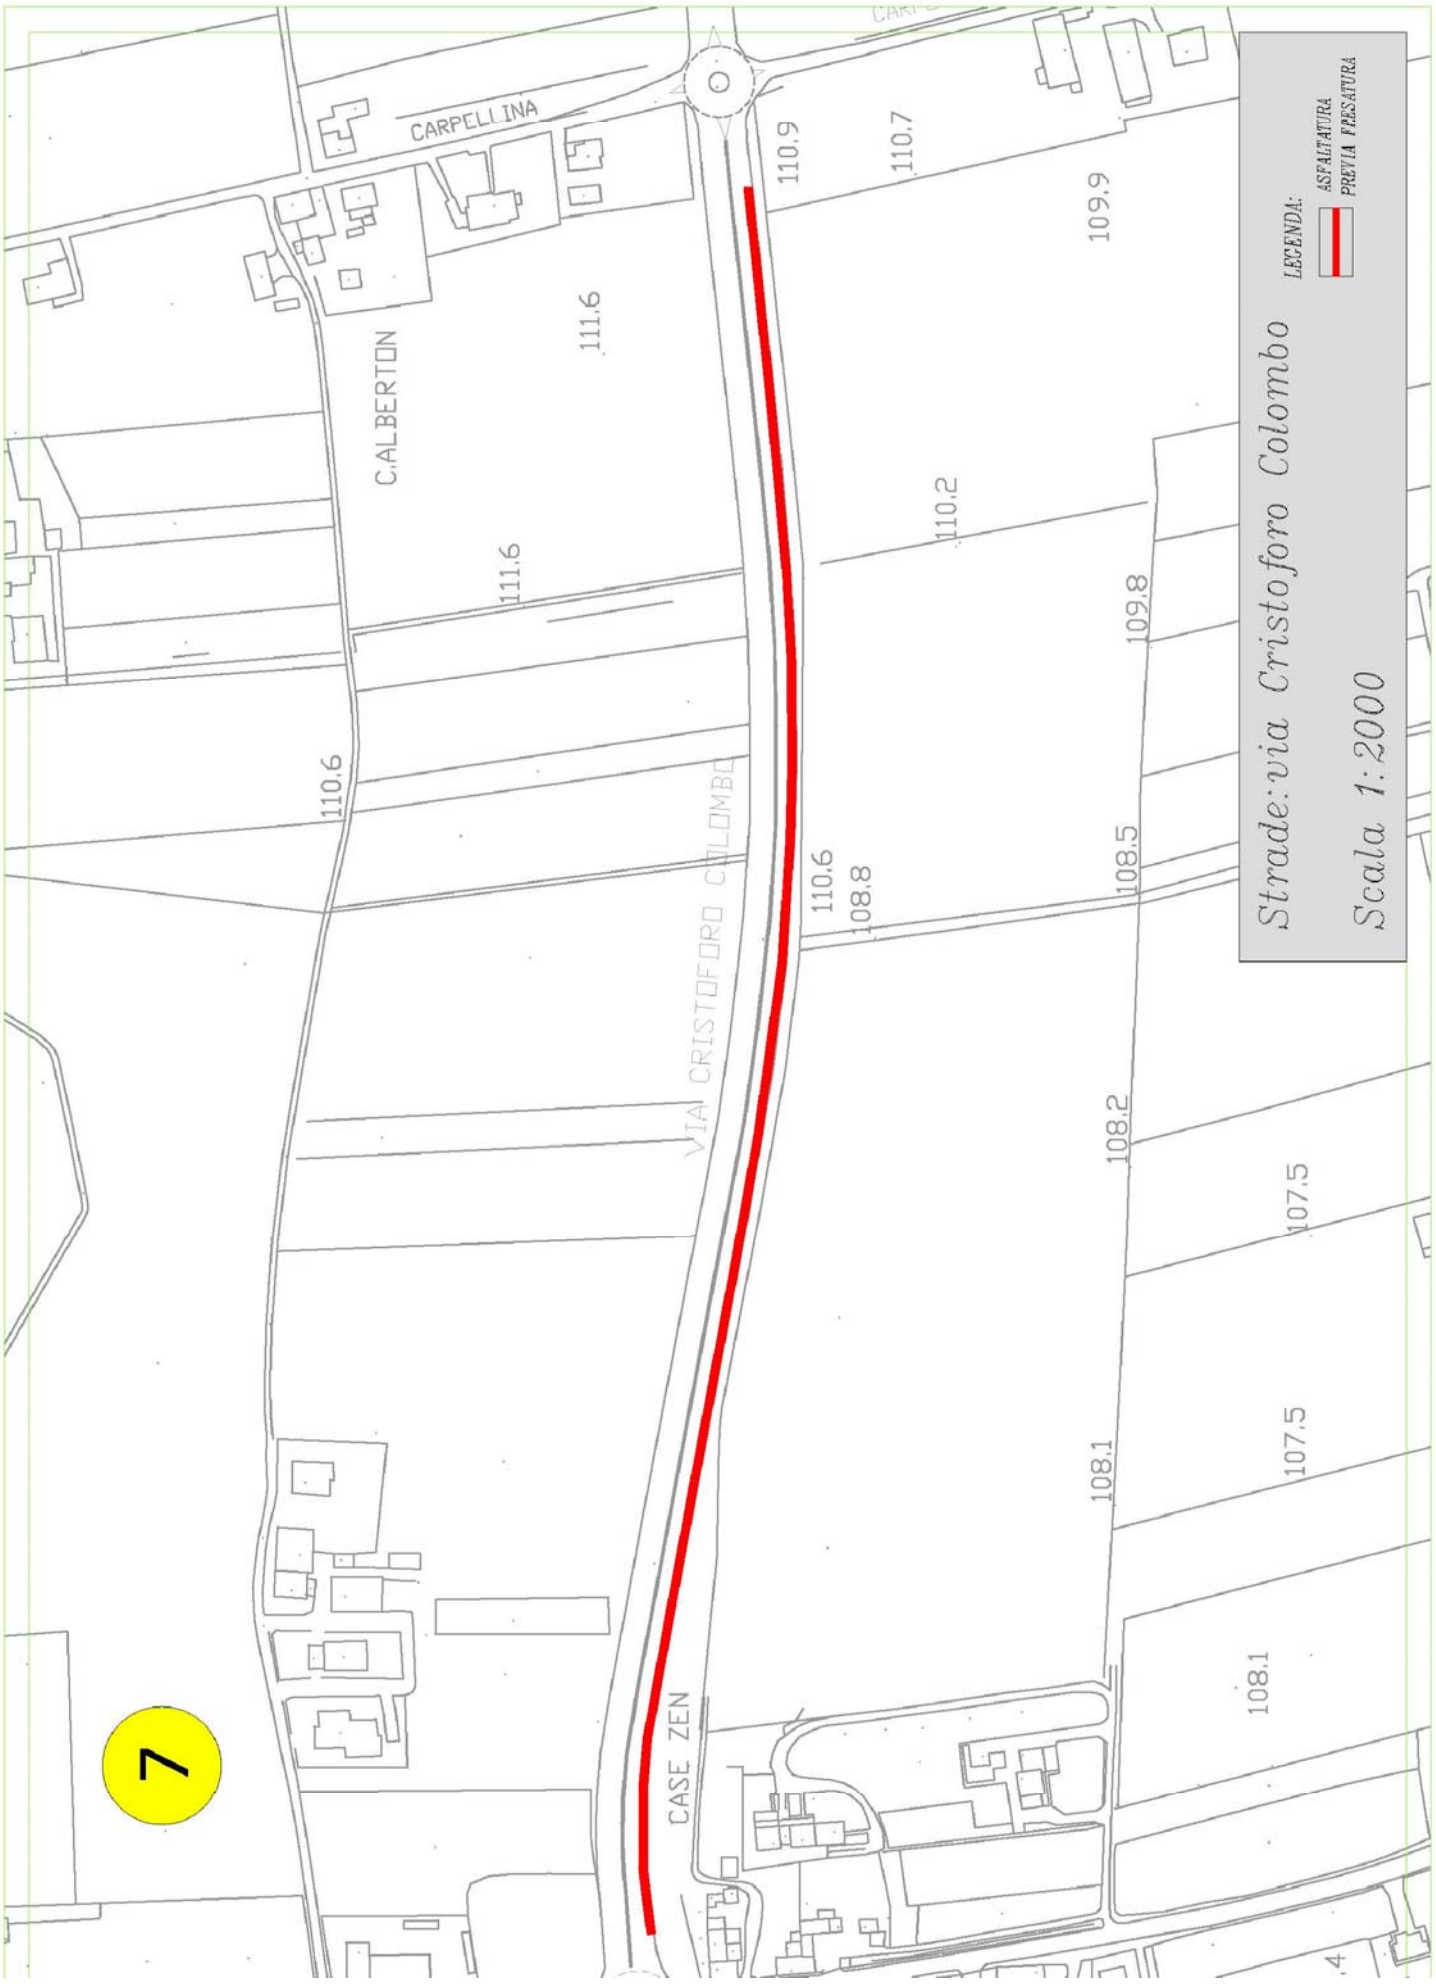

TRATTO 08 - Marciapiede Via San Rocco

ISTRUZIONI OPERATIVE:

Rifacimento marciapiede con ristringimento careggiata per installazione area di cantiere - Obbligo di instituire senso unico altrernato con ausilio di movieri stabili e/o impianto semaforico mobile

